DOKUMEN PROPOSAL EKSEKUTIF & BLUEPRINT BISNIS (TAHAP 1)

PROPOSAL PENGEMBANGAN & KONSEP PRODUK: PLATFORM EKOSISTEM EVENT TERPADU

Marketplace Empat Sisi (Event Organizer, Vendor Produksi, Event Crew, & Tenant Pameran) dengan Integrasi Pembayaran Langsung & Rekening Bersama (Escrow Payment Gateway)

Dokumen ini disusun sebagai landasan strategis untuk **Pitching Klien & Investor**. Materi di dalamnya mencakup tahapan penciptaan produk digital dari nol, arsitektur konsep produk empat pilar (*4-Sided Marketplace*), mekanisme alur bisnis & monetisasi transaksi langsung (*In-App Direct & Escrow Payment*), hingga rencana kerja pengembangan perangkat lunak (*SDLC Roadmap*) berbasis **Website MVP** yang siap diekspansi ke aplikasi **Android & iOS**.

Dimensi Proyek	Spesifikasi Strategis & Arah Pengembangan
Target Pasar Utama	Penyelenggara Konser Musik, Pentas Seni (Pensi Sekolah/Kampus), Pameran/Expo, Festival Kuliner, & Acara Korporat di Indonesia.
4 Pilar Ekosistem	1) **Event Creator / EO** (Pemilik Acara), 2) **Vendor Acara** (Peralatan & Produksi), 3) **Event Crew** (SDM Operasional Harian), 4) **Tenant** (Penyewa Booth/Bazaar).
Sistem Transaksi	**Direct In-App Payment & Escrow Ledger** (VA Bank, QRIS, E-Wallet, Kartu Kredit) dengan pencairan dana bertahap berbasis *milestone* & presensi.
Strategi Platform	**Tahap 1 (MVP):** Responsive Web Application (PWA-Ready) & Central RESTful API. **Tahap 2 (Ekspansi):** Aplikasi Mobile Native/Cross-Platform (Android & iOS) pasca-investasi/kontrak klien.
Durasi Pengembangan	**16 Minggu (4 Bulan)** untuk Web MVP Siap Komersial (+8 Minggu untuk ekspansi Mobile Android & iOS).

Status Dokumen:
Dokumen Tahap 1 (Konsep, Business Flow & Proposal Pitching)

Tahap Selanjutnya (Tahap 2):
SRS (System Requirement), User Flow, Flowchart & Database ERD

Tanggal Penyusunan:
Oktober 2026 — Jakarta, Indonesia

1. Ringkasan Eksekutif: Mengatasi Fragmentasi Industri Event dengan Ekosistem Satu Pintu

Penyelenggaraan sebuah acara—baik skala pentas seni kampus, pameran UMKM, hingga konser musik berskala besar—selalu melibatkan rantai pasok yang kompleks. Saat ini, seorang **Event Organizer (EO)** atau kepanitiaan harus menghabiskan 60% hingga 70% waktu persiapan mereka hanya untuk melakukan koordinasi manual yang terfragmentasi: menghubungi puluhan *vendor* panggung dan *sound system* satu per satu lewat WhatsApp, merekrut puluhan *event crew* lepasan melalui formulir tersebar, serta mengelola pendaftaran ratusan *tenant* pameran menggunakan *spreadsheet* manual yang rawan kesalahan rekapitulasi.

Di sisi lain, para pelaku ekosistem juga menghadapi risiko finansial yang tinggi. **Vendor peralatan** kerap mengalami pembatalan sepihak atau keterlambatan pelunasan pasca-acara. **Event Crew** (*usher, LO, stagehand, runner*) sering mengalami ketidakpastian pencairan honorarium hingga berminggu-minggu setelah acara selesai. Sementara itu, para **Tenant UMKM/Brand** rawan menjadi korban penipuan acara fiktif atau perubahan denah *booth* yang tidak transparan.

Solusi yang Ditawarkan: Kami mengusulkan pembangunan **Platform Ekosistem Event Terpadu (Multi-Sided Event Marketplace)** yang menyatukan seluruh kebutuhan pra-acara, eksekusi hari-H, hingga penyelesaian pembayaran dalam satu sistem terintegrasi. Dengan dukungan **Pembayaran Langsung (*Direct In-App Payment*) berbasis Rekening Bersama (*Escrow*)**, platform ini menjamin keamanan aliran dana bagi EO, kepastian modal kerja bagi Vendor, pembayaran instan bagi Event Crew, serta perlindungan transaksi resmi bagi Tenant.

2. Lima Tahapan Menciptakan Produk Digital (End-to-End Product Lifecycle)

Untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sebuah ide sistem diubah menjadi produk komersial yang matang dan siap dipresentasikan ke klien maupun investor, pengembangan produk ini dibagi ke dalam **5 Tahapan Baku Siklus Produk Digital**:

Tahapan Siklus	Fokus Utama & Tujuan	Aktivitas Kunci yang Dilakukan	Dokumen Keluaran (Deliverables)
Tahap 1: Product Discovery & Bisnis *(Fokus Saat Ini)*	Memvalidasi nilai jual produk, model pendapatan, dan alur uang agar layak didanai klien/investor.	Memetakan masalah 4 pengguna utama, menyusun alur transaksi *escrow*, struktur komisi, serta strategi bisnis.	• Konsep Produk • Business Flow • Proposal Pitching
Tahap 2: System Requirement & Alur Logika *(Tahap Berikutnya)*	Menerjemahkan konsep bisnis menjadi daftar spesifikasi teknis yang terukur dan bebas multitafsir.	Menyusun daftar kebutuhan fungsional & non-fungsional, merancang langkah layar (*user flow*) dan logika sistem.	• Dokumen SRS & PRD • User Flow 4 Peran • System Flowchart

Tahapan Siklus	Fokus Utama & Tujuan	Aktivitas Kunci yang Dilakukan	Dokumen Keluaran (Deliverables)
Tahap 3: Arsitektur Data & Desain UI/UX	Merancang struktur penyimpanan data transaksi serta tampilan visual aplikasi yang ramah pengguna.	Membuat relasi tabel *database* (termasuk buku besar *escrow*) dan merancang prototipe layar Web interaktif.	• Rancangan Database (ERD) • Wireframe & High-Fidelity UI Prototype
Tahap 4: Pengembangan & Integrasi (SDLC)	Membangun kode program aplikasi Web MVP dan menghubungkan *Payment Gateway*.	Pengembangan *Backend API*, *Frontend Web*, integrasi QRIS/Virtual Account, serta pengujian keamanan (*QA & UAT*).	• Source Code Web & API • Dokumen Hasil UAT • Sistem Siap Rilis
Tahap 5: Go-Live & Ekspansi Mobile App	Meluncurkan Web MVP ke pasar nyata dan memperluas jangkauan ke pengguna perangkat bergerak.	*Deployment* ke server Cloud, akuisisi EO/Vendor perdana, dan pengembangan aplikasi Android & iOS.	• Live Web Platform • Aplikasi Android (.aab) & iOS (App Store)

3. Konsep Produk: Arsitektur Ekosistem Empat Pilar (4-Sided Marketplace)

Berbeda dengan direktori vendor konvensional yang hanya menampilkan nomor telepon, produk ini dirancang sebagai **Transactional Workspace & Marketplace**. Satu akun pengguna dapat memiliki peran spesifik atau beralih peran (*Role Switching*) sesuai kebutuhannya di dalam ekosistem:

Aktor Pengguna	Segmen Target	Fitur Utama di Dalam Sistem	Nilai Tambah (Value Proposition)
1. Event Creator / Organizer (EO)	EO Profesional, Panitia Pensi Kampus/Sekolah, Promotor Konser, Korporat, Komunitas.	• **Event Project Hub:** Kelola 1 acara terpadu. • **Vendor Booking:** Pesan & bayar paket alat. • **Crew Hiring:** Buka lowongan & kelola shift. • **Booth Manager:** Buka sewa & kurasi tenant.	Hemat 60% waktu pencarian & koordinasi; anggaran terkontrol di satu dasbor; terima uang sewa *tenant* otomatis.
2. Vendor Acara (Peralatan & Jasa)	Vendor Sound System, Rigging/Stage, Lighting, LED, Tenda/Partisi, Genset, Dokumentasi.	• **Katalog & Paket Harga:** Etalase spek teknis. • **Smart Calendar:** Blokir tanggal otomatis. • **Custom Quotation:** Kirim penawaran khusus. • **Escrow Tracking:** Pantau pencairan DP & lunas.	Kepastian pembayaran dengan deposit di *Escrow* sebelum barang dikirim; perluasan pasar tanpa biaya pemasaran.


Aktor Pengguna	Segmen Target	Fitur Utama di Dalam Sistem	Nilai Tambah (Value Proposition)
3. Event Crew (SDM & Talenta)	Stage Manager, LO, Usher, Ticketing, Runner, Soundman, Dokumentator, Keamanan.	• **Profil & Portofolio:** Riwayat event & rating. • **Job Shift Board:** Lamar posisi sesuai jadwal. • **QR Attendance:** Check-in/out lokasi acara. • **Instant Wallet:** Tarik honor langsung ke bank.	Jaminan honor 100% aman (sudah didepositkan EO sebelum acara) dan cair instan begitu *shift* kerja selesai.
4. Tenant / Exhibitor	UMKM Kuliner (F&B), Brand Lokal/Fashion, Sponsor, Komunitas Pameran.	• **Direktori Open Tenant:** Cari event potensial. • **Interactive Floorplan:** Pilih titik/nomor booth. • **Curated Registration:** Unggah profil produk. • **Instant Invoicing:** Bayar sewa resmi via VA/QRIS.	Bebas penipuan event bodong karena dana dijamin *Escrow*; seleksi kurasi dan pemilihan titik *booth* transparan.

Keunggulan Kompetitif Produk (Unique Selling Proposition untuk Pitching Klien)

- **All-in-One Event Command Center:** Penyelenggara tidak perlu menggunakan tiga aplikasi berbeda untuk mencari vendor panggung, merekrut kru harian, dan menjual *booth* bazaar—seluruhnya terhubung pada satu *Event ID* yang sama.
- **Cashflow Cross-Subsidy (Subsidi Silang Arus Kas EO):** Pendapatan yang diperoleh EO dari pembayaran sewa *booth* oleh *Tenant* di dalam platform dapat langsung dialokasikan di dasbor untuk membayar DP *Vendor* atau mendepositkan gaji *Event Crew*, menciptakan perputaran uang tertutup (*closed-loop economy*) di dalam ekosistem kita.
- **Mitigasi Risiko Hukum & Finansial Otomatis:** Setiap kesepakatan menghasilkan *Surat Perjanjian Kerja (SPK) Digital* otomatis yang mengikat jadwal pengiriman, spesifikasi teknis, serta syarat pencairan dana *Escrow*.

4. Business Flow & Mekanisme Pembayaran Langsung (Escrow Architecture)

Sesuai kebutuhan bisnis untuk menangani pembayaran langsung (*Direct Payment*), platform bekerja sama dengan **Payment Gateway Terlisensi Bank Indonesia (seperti Midtrans / Xendit)** untuk menyediakan kanal pembayaran lengkap (Virtual Account seluruh bank, QRIS, E-Wallet GoPay/OVO/Dana, dan Kartu Kredit) serta fitur **Split-Payment & Escrow Disbursement**.

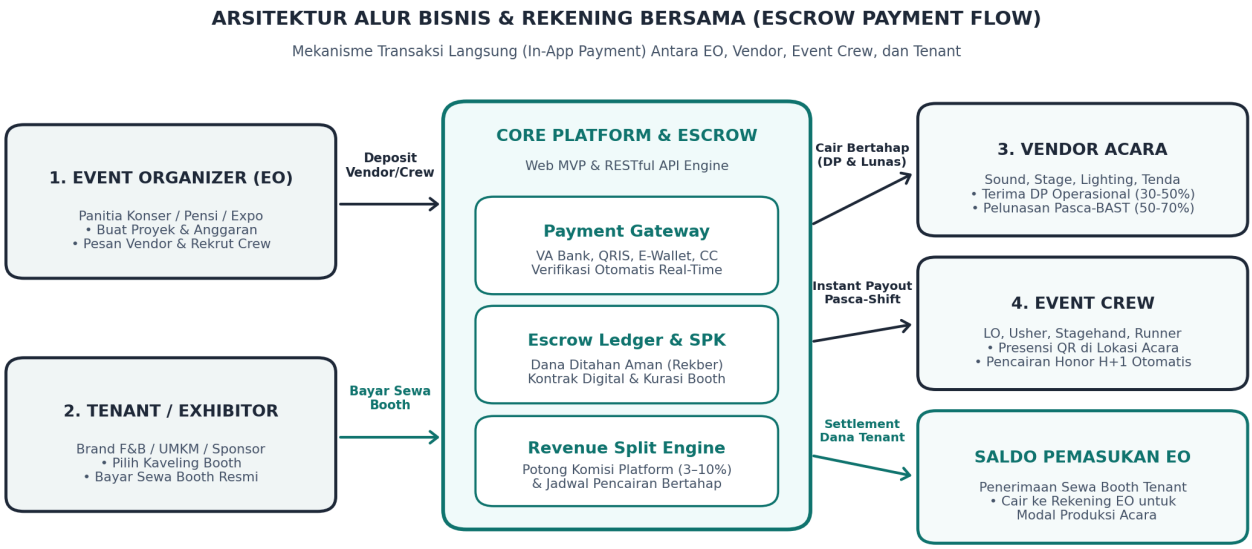

Gambar 1: Arsitektur Alur Transaksi Empat Sisi & Mekanisme Penahanan/Pencairan Dana Rekening Bersama (Escrow Ledger).

Rincian Tiga Alur Transaksi & Pencairan Dana (Disbursement Rules)

1. **Alur Transaksi 1 — Pemesanan Vendor oleh EO (EO → Escrow → Vendor):**
   - **Tahap Booking & Deposit:** EO memilih paket layanan Vendor (atau menyetujui *Custom Quote* hasil negosiasi di ruang obrolan). EO membayarkan nilai kontrak (100% di muka atau skema DP 50% + Pelunasan H-3) ke rekening *Escrow* platform.
   - **Pencairan Tahap Pertama (Modal Operasional 30%–50%):** Saat status pesanan memasuki H-7 atau ketika Vendor mengunggah bukti kesiapan/pengiriman logistik (*Delivery Order*) yang terverifikasi, sistem mencairkan termin pertama ke saldo Vendor.
   - **Pelunasan Akhir (Settlement 50%–70%):** Setelah acara selesai dan kedua pihak menekan tombol *Berita Acara Serah Terima (BAST) Digital* (atau otomatis dalam 2×24 jam jika tidak ada klaim sengketa), sisa dana dicairkan ke rekening Vendor setelah dipotong komisi platform.

2. **Alur Transaksi 2 — Perekrutan & Penggajian Event Crew (EO → Escrow → Crew):**
   - **Publikasi & Seleksi:** EO mempublikasikan kuota kebutuhan kru beserta besaran honor per *shift*. Kandidat melamar, dan EO memilih kru yang lolos seleksi.
   - **Lock Deposit Gaji Kru:** Agar status rekrutmen sah (*Confirmed*), EO wajib menyetorkan total dana honorarium seluruh kru terpilih ke *Escrow* paling lambat H-3 acara.
   - **Presensi & Pencairan Instan:** Pada hari pelaksanaan, kru melakukan *check-in* dan *check-out* dengan memindai QR Code koordinator lapangan melalui *browser* ponsel. Begitu *shift* selesai, dana honor langsung berpindah dari *Escrow* ke dompet saldo kru dan dapat ditarik ke rekening pribadi saat itu juga.

3. **Alur Transaksi 3 — Penyewaan Booth oleh Tenant (Tenant → Escrow → EO):**
   - **Registrasi & Kurasi:** Calon *tenant* memilih lokasi kaveling pada peta *booth* acara dan mengisi profil produk/merek. EO melakukan kurasi (*Approve/Reject*) agar jenis dagangan tidak saling bertabrakan secara berlebihan.

- **Pembayaran & Proteksi Dana:** *Tenant* yang disetujui menerima tagihan otomatis dengan batas waktu bayar (*payment expiry* 24 jam). Dana sewa disimpan di *Escrow* dan dicairkan ke EO secara bertahap (misalnya 50% saat penutupan pendaftaran untuk modal produksi EO, dan 50% saat hari-H acara berlangsung).

Model Monetisasi & Proyeksi Sumber Pendapatan Platform


Tabel berikut merinci struktur komisi berlapis (*multi-layered take rate*) yang menjadi sumber pendapatan utama platform dari setiap perputaran transaksi di dalam ekosistem:

Sumber Pendapatan	Pihak Dikenakan	Tarif / Komisi	Mekanisme Pemotongan & Nilai Jual
1. Vendor Commission Fee	Vendor Acara	**5% – 8%**	Dipotong otomatis dari nilai kontrak saat pencairan pelunasan akhir ke rekening Vendor.
2. Crew Management Fee	EO & Event Crew	**5% – 10%**	Biaya layanan rekrutmen, fitur presensi QR, dan pencairan gaji otomatis (*payroll disbursement*).
3. Tenant Booth Fee	Event Organizer (EO)	**3% – 5%**	Dipotong otomatis dari setiap transaksi sewa *booth* yang berhasil dibayarkan oleh *Tenant*.
4. Platform Escrow & Admin Fee	Pembayar (Checkout)	**Rp 5.000 – 15.000**	Biaya administrasi transaksi langsung (*pass-through fee* Payment Gateway & proteksi kontrak digital).
5. Featured Listing / Ads	Vendor & EO	**Rp 250rb – 1,5jt/bln**	Langganan opsional untuk menempatkan profil Vendor atau promo *Open Tenant* di urutan teratas.

5. Proposal Pengembangan: Strategi SDLC, Timeline, & Arsitektur Ekspansi

Dalam mempresentasikan proyek ini kepada klien atau investor, efisiensi anggaran awal dan kecepatan peluncuran produk (*Time-to-Market*) adalah kunci utama. Oleh karena itu, kami merancang strategi pengembangan dua fase: **Fase 1 fokus pada peluncuran Responsive Web Application (Web MVP) dalam 16 Minggu**, diikuti **Fase 2 berupa ekspansi ke Aplikasi Mobile Android & iOS dalam 8 Minggu** setelah validasi pasar atau pendanaan turun.

Pendekatan *Web-First MVP* memastikan seluruh pengguna—mulai dari EO yang membutuhkan layar lebar untuk memantau anggaran dan kurasi puluhan *tenant*, hingga kru lapangan yang hanya memerlukan *browser* ponsel untuk memindai QR kehadiran—dapat langsung bertransaksi sejak hari pertama tanpa kendala instalasi aplikasi.

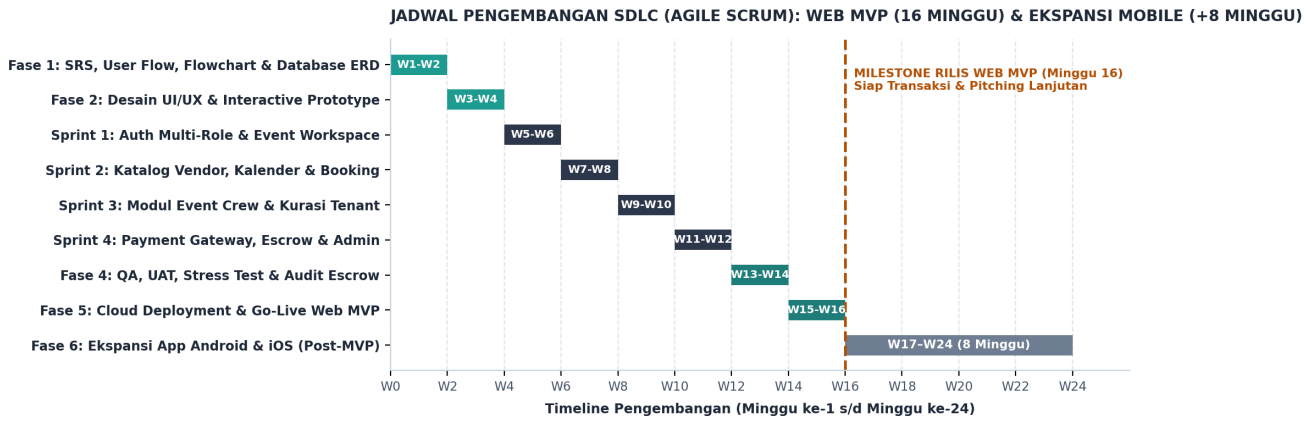

Gambar 2: Peta Jalan Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC Agile Scrum) — 16 Minggu Web MVP & 8 Minggu Ekspansi Mobile.

Rincian Tahapan SDLC & Jadwal Kerja Pengembangan (Web MVP — 16 Minggu)

Fase SDLC	Durasi Waktu	Lingkup Pekerjaan Teknis & Modul	Target Capaian (Milestone)
Fase 1: System Blueprint & Engineering Spec	Minggu 1 – 2 *(2 Minggu)*	Penyusunan dokumen SRS, User Flow 4 peran, System Flowchart, perancangan Database ERD (PostgreSQL), dan spesifikasi RESTful API.	Dokumen Teknis Final disetujui klien (*Sign-off Blueprint*).
Fase 2: UI/UX Design & Prototyping	Minggu 3 – 4 *(2 Minggu)*	Pembuatan *Design System*, *Wireframe*, dan *Interactive High-Fidelity Prototype* (Desktop & Mobile Web View) untuk EO, Vendor, Crew, Tenant, & Admin.	Prototipe Figma interaktif siap diuji coba saat *pitching*.
Fase 3 — Sprint 1: Core & Event Workspace	Minggu 5 – 6 *(2 Minggu)*	Sistem autentikasi multi-peran (SSO/RBAC), verifikasi identitas (KYC Vendor/EO), dan modul pembuatan proyek event (*Event Workspace*).	Pengguna dapat mendaftar, verifikasi, & membuat acara.
Fase 3 — Sprint 2: Vendor Marketplace	Minggu 7 – 8 *(2 Minggu)*	Manajemen katalog vendor, kalender ketersediaan alat, fitur pencarian terfilter, negosiasi penawaran (*Custom Quote*), & keranjang pesanan.	Alur pencarian & pemesanan vendor berjalan utuh.
Fase 3 — Sprint 3: Crew & Tenant Module	Minggu 9 – 10 *(2 Minggu)*	Papan lowongan *Event Crew*, sistem seleksi lamaran, presensi QR Code, serta modul pendaftaran, kurasi (*Approve/Reject*), dan denah *booth Tenant*.	Modul rekrutmen kru & kurasi *booth tenant* terintegrasi.
Fase 3 — Sprint 4: Payment & Escrow Engine	Minggu 11 – 12 *(2 Minggu)*	Integrasi *Payment Gateway* (VA, QRIS, E-Wallet), buku besar *Escrow Ledger*, kontrak SPK otomatis, pencairan dana bertahap, & Admin Panel.	Pembayaran langsung & pencairan *escrow* berfungsi penuh.

Fase SDLC	Durasi Waktu	Lingkup Pekerjaan Teknis & Modul	Target Capaian (Milestone)
Fase 4: QA, Security & UAT	Minggu 13 – 14 *(2 Minggu)*	*Integration Testing*, simulasi rekonsiliasi pembayaran, *penetration testing* keamanan saldo, serta *User Acceptance Testing (UAT)* bersama klien.	Sistem bebas *bug* kritis & lulus uji keamanan transaksi.
Fase 5: Deployment & Go-Live	Minggu 15 – 16 *(2 Minggu)*	Konfigurasi server produksi (*Cloud Hosting*, SSL, Auto-Backup), migrasi *Production Payment Gateway*, pelatihan tim klien, & peluncuran resmi.	**Web MVP Live** & siap melayani transaksi komersial.
Fase 6 (Opsional): Ekspansi Mobile App	Minggu 17 – 24 *(+8 Minggu)*	Pengembangan aplikasi **Android & iOS** menggunakan Flutter/React Native yang langsung mengonsumsi *RESTful API* dari Web MVP + fitur *Push Notification*.	Aplikasi rilis di Google Play Store & Apple App Store.

Spesifikasi Arsitektur Teknologi (Tech Stack) & Alokasi Tim

Agar transisi dari berbasis **Website (Tahap Awal)** menuju **Aplikasi Android & iOS (Tahap Ekspansi)** berjalan mulus tanpa menulis ulang logika sistem dari nol, kami menerapkan arsitektur **Decoupled API-First Architecture**:

- **Frontend Web Application (MVP):** Dibangun menggunakan **Next.js (React Framework) + Tailwind CSS** dengan dukungan *Progressive Web App (PWA)*. Tampilan otomatis menyesuaikan layar laptop (nyaman bagi EO & Vendor saat mengunggah katalog) maupun layar ponsel pintar (nyaman bagi Crew saat memindai QR presensi dan Tenant saat mendaftar).
- **Backend & Core Transaction Engine:** Dibangun menggunakan **Node.js (NestJS / TypeScript)** atau **Go (Golang)** dengan arsitektur modular RESTful API. Seluruh perhitungan komisi, penguncian jadwal, dan otorisasi pencairan *Escrow* berada di lapisan API ini, sehingga siap langsung digunakan oleh aplikasi Android/iOS di Fase 6.
- **Database & Financial Ledger:** Menggunakan **PostgreSQL** yang mendukung transaksi *ACID-compliant* dan *Row-Level Locking* untuk mencegah saldo ganda (*double-spending*) atau bentrok jadwal pesanan (*double-booking*), dipadukan dengan **Redis** untuk kecepatan akses katalog.
- **Infrastruktur Pembayaran & Cloud:** Terintegrasi dengan **Midtrans / Xendit Payouts & Split Payment API**, serta di-*hosting* pada layanan Cloud berskala elastis (AWS / Google Cloud Platform / Alibaba Cloud) dengan penyimpanan dokumen kontrak terenkripsi.
- **Komposisi Tim Pengembang Inti (7 Personel untuk Web MVP):** 1 *Project Manager / System Analyst*, 1 *UI/UX Product Designer*, 2 *Backend & Payment Integration Engineer*, 2 *Frontend Web Engineer*, dan 1 *Quality Assurance (QA) Engineer* (ditambah 2 *Mobile Engineer* saat memasuki Fase Ekspansi Android/iOS).

6. Langkah Selanjutnya: Peta Jalan Menuju Tahap Teknis (Tahap 2)

Dokumen Proposal Bisnis, Konsep Produk, dan *Business Flow* ini dirancang sebagai fondasi utama untuk menyamakan visi produk sekaligus bahan presentasi (*pitching*) kepada calon klien atau mitra investor.

Begitu kerangka konsep produk, skema komisi, dan alur *Escrow* pada dokumen ini telah sesuai dengan ekspektasi Anda, kita siap melangkah ke **Tahap 2 (Perancangan Teknis & Spesifikasi Sistem)** yang meliputi:

1. **System Requirement Specification (SRS):** Daftar rinci seluruh kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*) dan non-fungsional untuk masing-masing peran (EO, Vendor, Crew, Tenant, dan Super Admin).
2. **User Flow & System Flowchart:** Diagram alur langkah demi langkah dari sudut pandang pengguna maupun logika validasi sistem (registrasi, pemesanan, kurasi *tenant*, presensi kru, hingga pencairan *Escrow*).
3. **Rancangan Database (Entity Relationship Diagram / ERD):** Struktur tabel lengkap beserta atribut kunci (*Primary Key / Foreign Key*) yang menangani relasi pengguna, proyek event, katalog, kontrak, dan buku besar transaksi.
